

LAUDO DE FISCALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE ESCAVADO

1. Localização e propriedade:

Proprietário: LEANDRO GOMES LOPES
 Localidade: SÃO GERALDO Município: Cristal
 Telefone: 5199459791 CPF: 009.729.470-51
 Finalidade: Dessedentação Animal

Coordenadas Geográficas: SAD 69

	Grau °	min '	seg "
Latitude	-30	54	49,85
Longitude	-52	9	10,60

2. Dados do escritório municipal e do técnico responsável:

Escritório Municipal da Emater de: CRISTAL
 Endereço do escritório: RUA SETE DE SETEMBRO, 177
 Profissional responsável pelo projeto: Ana Paula Jeske
 Número de registro no CREA: CFTA02490360027 Técnico Agrícola
 Data da elaboração do projeto: 18/08/2022 Telefone: 5197338972

3. Dados da empresa construtora:

Nome: Terpacon

4. Dados da obra:

Açude escavado

4.1 Medidas estabelecidas no projeto:

Dimensões	Comprimento		Largura		Área	
Medidas de fundo	31,24	m	9,24	m	288,66	m ²
Medidas de superfície	40,00	m	18,00	m	720,00	m ²
Medidas no nível do aterro	44,92	m	22,92	m	1.029,57	m ²

Altura média de corte: 1,46 m


Volume de terra escavada: 736,32 m³

4.2 Medidas da obra concluída:

Dimensões	Comprimento		Largura		Área	
Medidas de fundo	32,50	m	15,00	m	487,50	m ²
Medidas de superfície	41,00	m	21,00	m	861,00	m ²
Medidas no nível do aterro	49,00	m	32,00	m	1.568,00	m ²

Altura média de corte: 1,80 m

Volume de terra escavada: 1.190,70 m³

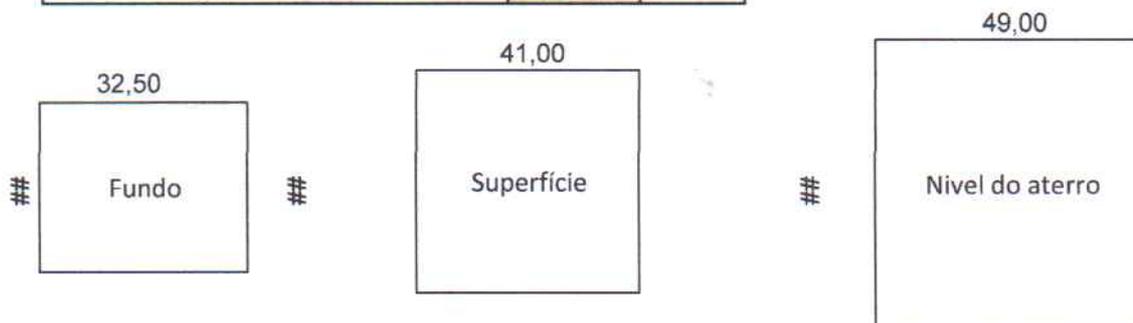

5. Atestado

Data da vistoria: 31/01/2024

Na data acima citada foi realizada a vistoria por este técnico da EMATER-RS/ASCAR, responsável pela fiscalização da obra da construção do micro açude.

Para tanto, atesto para os devidos fins que a empresa antes citada, contratada através de instrumento contratual sob referência, de acordo com os procedimentos especificados em termo de referência do edital público, e ainda com base no constante em projeto apresentado pela EMATER/RS - ASCAR:

Executou os serviços contratados.

Executou parcialmente os serviços contratados.

Não executou os serviços contratados satisfatoriamente.

Informações complementares:

Material bastante encharcado devido excesso de chuvas do período do inverno e primavera. Optou-se por aprofundar o reservatório para maior capacidade de armazenamento.

6. Local: CRISTAL Data: 31/01/2024
Nome do Responsável: Ana Paula Jeske
CREA: CFTA 02490360027


Assinatura

7. Anexo I

Foto do local da obra:


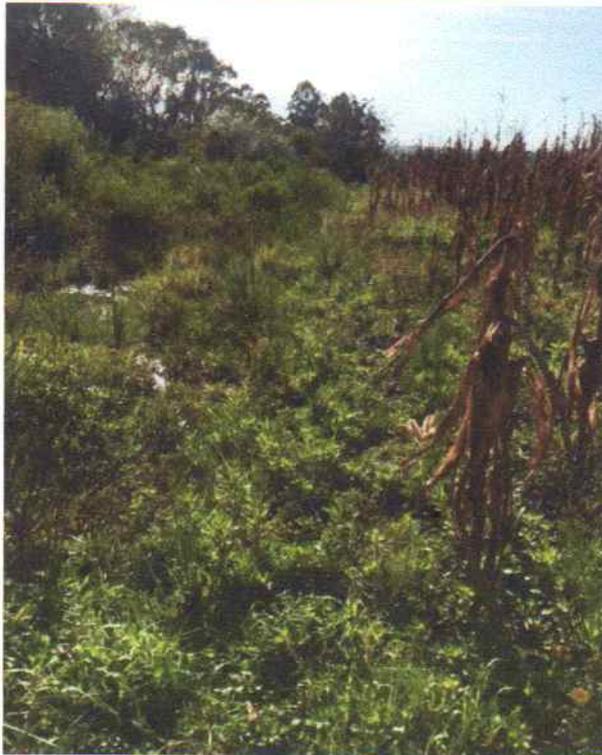


Foto da obra concluída (I):



Foto da obra concluída (II):

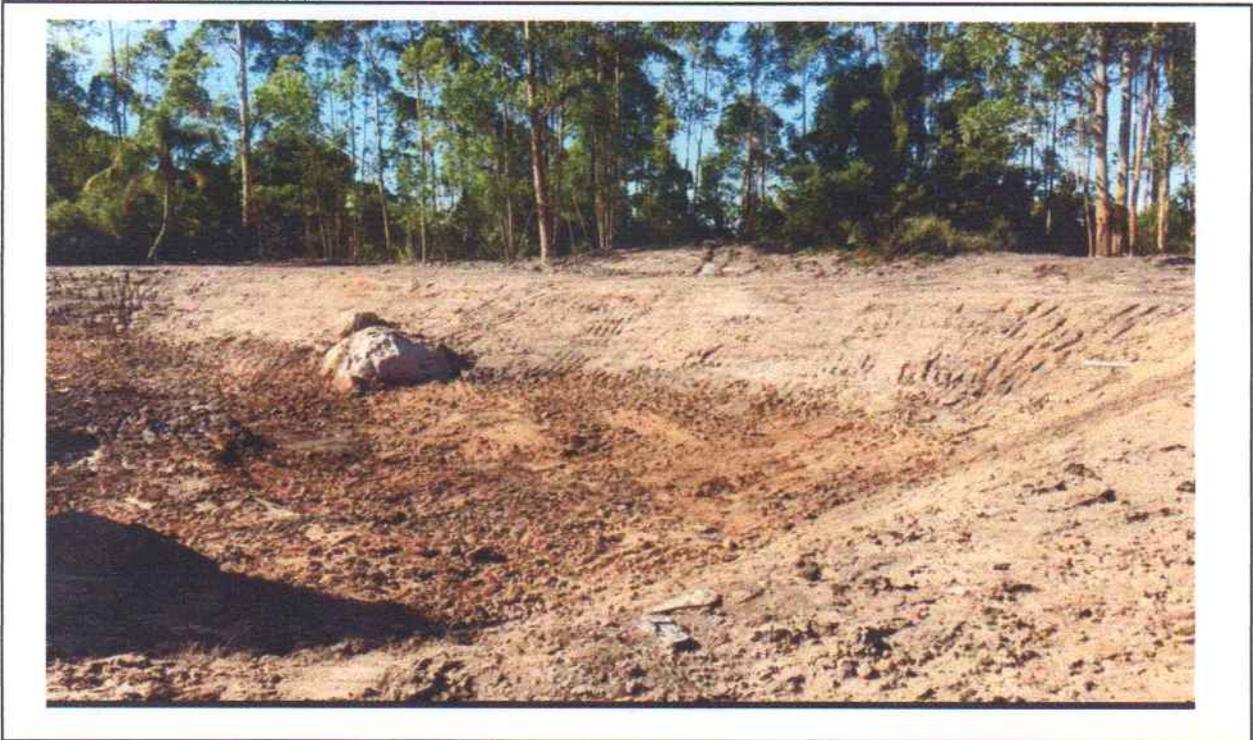

[Handwritten signature]
